



*Opération de Développement Rural*

*RAPPORT ANNUEL 2016*

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	1.1	Prévoir un soutien pour l'entretien des salles de Fraiture et Florzé		Commune
Lot 0	1.1	Aménager une place à Hautgné		Commune
Lot 0	1.3	Mise à disposition d'un local pour l'ONE		Un local, dans le centre de Sprimont, a été attribué à l'ONE

Lot 0	1.5	Prévoir un Conseil communal des jeunes		Le 1 <sup>er</sup> conseil communal des jeunes s'est tenu début 2010 (réunion mensuelle)
Lot 0	1.11	Rénover les anciens vestiaires du hall omnisports		
Lot 0	1.13	Organiser une journée des "aplovous"		La 1 <sup>re</sup> a eu lieu le 09/09/2009 avec remise en cadeau aux participants d'un DVD présentant la Commune. Une journée est organisée chaque année.
Lot 0	1.14	Prévoir un accès Internet pour tous dans les bibliothèques de (Louveigné) et Banneux		
Lot 0	2.4	Continuer à développer la promotion des produits du terroir (en plus de la vitrine prévue en fiche projet).		Cela se fait via le Greova et la Maison du Tourisme
Lot 0	2.6	Placer des panneaux avec les offres d'emploi des sociétés d'Intérim à l'Administration communale		Bureau ALE et création de la cellule emploi (PCS)
Lot 0	2.6	Réaliser des toutes boîtes d'information sur les cours de promotion sociale à plus grande échelle, en Ourthe-Ambève		Information donnée par voie de presse
Lot 0	3.1	Améliorer encore l'entretien des ruisseaux et rivières		La commune de Sprimont dépend de 3 contrats rivières

Lot 0	3.2	Faciliter l'élimination des déchets verts pour les villages isolés et les personnes qui ne peuvent se déplacer en voiture		
Lot 0	Fiche 3.6 réalisée au ¾ à titre de lot 0	STINVAL Rénovation de la fontaine et aménagement de ses abords		Commune
Lot 0	Fiche 3.7 réalisée à titre de lot 0	Sprimont (Chanxhe) – Développement du RAVeL 5 de l'Ourthe et de sa liaison avec l'Amblève		Ministère de l'Équipement et des Transports
Lot 0	3.7	Améliorer les relations "agriculteurs – non agriculteurs" par une information sur l'agriculture		Organisation par des agriculteurs de « ferme-ouverte »
Lot 0	4.1	Réaliser un maillage de sentiers inter villages		Les travaux du dossier PICVert Florzé-Sprimont sont terminés.
Lot 0	4.2	Favoriser le co-voiturage		Le Projet « covoit'stop » a démarré
Lot 0	4.3	Améliorer la signalisation du zoning de Cornemont		Le MET a accepté de mettre une signalisation à la sortie de l'autoroute. Il reste encore à améliorer la signalisation à l'intérieur du zoning.
Lot 0	4.4	A Banneux-apparitions, retracer des aires de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite		Commune
Lot 0	6.2	Améliorer la signalisation touristique		Signalisation des promenades avec entretien permanent – réalisation par les services communaux.
Lot 0	6.3	Améliorer la collaboration entre le secteur touristique et le secteur culturel		Ils se rencontrent
Lot 0		Pose d'une stèle commémorative à Hotchamps		
Lot 1	1.2	Wachiboux : aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser		

2. Tableau des projets en cours

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	Fiche 1.1.	Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village	<p>Montant de départ (projet complet):  <u>MET</u> : 949.688,00 €  <u>Développement rural</u> : 962.668,00€ arrondi à 1.000.000,00 €  <u>Infrasport</u> : 90.750,00€  <u>Commune</u> : 263.354,00€</p> <p><u>Ces montants doivent être adaptés vu la scission du projet en deux phases (le SPW n'intervient pas) et le développement de la partie « aire multisports » subsidiée par Infrasport.</u></p> <p>L'<b>estimatif</b> du projet pour la « 1<sup>re</sup> phase » = 959.846,75 € TVAC  - Partie Développement rural (parking + chemin d'accès) : <b>660.619,94 €</b> (subsidiable à 80% soit pour un montant estimé de <b>528.495,95 €</b>)  - Partie Infrasport (plaine Multisports) : 299.226,81€ TVAC (susbsidiable à 85% dans le cadre du programme « sport de rue » soit pour un montant estimé de 254.342,79€ TVAC)  - Partie commune : estimée à 177.008,01€ TVAC</p>	<p>CGT Développement rural Commune</p>	<p><u>2015</u> :</p> <p>Partie Développement rural = lot 1 du marché de travaux (première phase plaine multisports avec aménagement d'une voirie piétonne, parking de 75 places, dépose minute et jeux pour les enfants – fiche projet approuvée par le ministre)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02/06</b> : attribution du marché à l'entreprise ABTECH par le Collège communal pour le montant de <b>488.617,92 € TVAC</b></li> <li>• <b>29/09</b> : approbation de l'attribution du lot1 par M. le Ministre René COLLIN. Subside provisoire (sur base de la soumission retenue augmentée des frais d'honoraires et de CSS) = <b>436.653,90 € TVAC</b></li> <li>• <b>02/10</b> : notification et commande des travaux</li> <li>• <b>19/10</b> : début des travaux du lot 1</li> </ul> <p><u>2016</u> :</p> <p>Lot 2 (aire multisports) du marché, subsidié par Infrasport notifié à l'entreprise LESUCO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalisation de la première phase (aménagement parking et plaine multisports).</li> </ul> <p><b>Rem</b> : travaux deuxième phase à réaliser en concertation avec le MET (gestionnaire de la voirie principale - collaboration avec le <i>SPW – DGO Routes et Bâtiments</i>) pas encore à l'ordre du jour.</p>
Lot 1	FICHE 1.4	DAMRE Aménagement convivial du centre du	242 728 €	CGT Développement rural Commune	<p><u>2016</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>23/03</b> : actualisation (nouvel estimatif) et approbation du nouvel estimatif de la fiche-projet par la CLDR</li> </ul>

		hameau en y intégrant le Prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'Interprétation de la Pierre			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>18/04</b> : fiche-projet transmise au Ministre de la ruralité</li> </ul> <p>- Chemin De Fer de Sprimont reconnu comme organisme touristique par le CGT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>15/06</b> : Centre d'Interprétation de la Pierre : travaux en cours mais besoin d'un important subside pour la scénographie (toujours en attente de la part du CGT).</li> </ul> <p><u>2017</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>31/01</b> : rencontre entre le CGT, la Commune et l'Administration régionale pour connaître la répartition des postes subsidiables par le CGT et par le Développement rural.</li> </ul>
Lot 2	FICHE 2.2	ADZEUX Plan Habitat Permanent: requalification de l'équipement touristique "Haute-Fagne Relax"	A déterminer	Développement rural Commune	<p><u>2015</u> : au niveau du Développement rural : statu quo</p> <p>L'administration communale a réalisé un marché de service désignant un géomètre qui a réalisé un projet de plan de cession de la voirie. L'objectif : intégrer la voirie actuelle dans le domaine public afin de pouvoir améliorer, via subsides, son aménagement en eau et électricité.</p> <p><u>2016</u> : réalisation des plans</p> <p><u>2017</u> : Intégration des voiries actuelles dans le domaine public</p>

Lot 2	FICHE 2.5	BANNEUX- APPARITIONS Aménagements afin de favoriser le tourisme, la convivialité et la sécurité aux abords du centre marial	166 375 €	Développement rural Commune	Réponse à l'appel à projets PwDR 2014-2020 (mesure 7.5). Projet non retenu
-------	-----------	---	-----------	--------------------------------	--

### 3. Tableau des projets en attente

<b>Priorité du PCDR</b>	<b>Numéro du projet</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Montant du projet à 100%</b>	<b>Pouvoir(s) subsidiant(s)</b>	<b>Programmation du projet</b>
Lot 1	FICHE 1.3	GOMZE Aménagement d'une zone conviviale à proximité de la salle "Le Tilleul", tout en renforçant son accessibilité	496 199 €	Développement rural Commune Infrasport	
Lot 1	FICHE 1.5	DAMRE (Zoning) Création d'une maison d'enfants communale dans le cadre du développement de la nouvelle zone économique	399 300 €	Ministère wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique Commune	
Lot 1	FICHE 1.6	HAYEN Aménagement de la place afin de valoriser le patrimoine local et de favoriser la convivialité	146 650 €	Développement rural Commune	
Lot 1	FICHE 1.7	OGNE Valorisation du patrimoine et sécurisation de la place, point de départ d'une promenade	191 872 €	Développement rural Commune	
Lot 1	FICHE 1.8	CORNEMONT Aménagement de la place et de ses abords, permettant le développement d'activités en intégration avec le patrimoine à valoriser	195 238 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.1	BANNEUX-VILLAGE Création d'une Maison de village, aménagement sécurisé de la place et des rues alentours jusqu'à la création d'un rond-point avenue Paola/rue des Fusillés, afin de renforcer les liens sociaux positifs entre les habitants	978 019 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.3	SPRIMONT Construction d'une structure de biométhanisation	3 399 000 €	A déterminer	



Lot 2	FICHE 2.4	FRAITURE Aménagement d'un lieu de convivialité	226 270 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.6	FLORZE Aménagement des infrastructures sportives et création d'équipements permettant la pratique de l'athlétisme	938 155 €	Développement rural Commune Infrasport	
Lot 2	FICHE 2.7	BLINDEF Valorisation du village et de ses atouts patrimoniaux, enfouissement des lignes électriques	146 410 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.8	BETGNE Aménagement d'un espace convivial afin de redynamiser le village	195 657 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.9	SPRIMONT (Entité) Création d'une vitrine des produits du terroir, biologiques et artisanaux, et de points de vente locaux (partenariat avec les commerces en Ourthe-Amblève)	A déterminer	A déterminer	Paniers du Terroir via le GREOVA et la MT OVA : Adhésion de la Commune au dossier de candidature du GALOVA (Fiche 2.4. Valorisation de l'agriculture biologique et conventionnelle en circuits-courts) =>Non retenu
Lot 3	FICHE 3.1	SPRIMONT (Entité) Collaboration avec Aywaille pour la mise en place d'une maison de l'emploi	La CLDR décide de s'aligner sur la position d'Aywaille		
Lot 3	FICHE 3.2	SPRIMONT (Entité) Acquisition de bâtiments intéressants à préserver et permettant notamment de diversifier l'offre de logements	A déterminer	A déterminer	Plan encrage du logement : achat de plusieurs bâtiments à transformer

Lot 3	FICHE 3.3	HORNAY Création de logements communaux destinés aux jeunes pour leur permettre de rester dans l'entité Remarque : 11 logements, sur l'ensemble des parcelles des deux lotissements Thomas Piron, situés de part et d'autre du Thier du Hornay, sont prévus à destination de jeunes couples. Les conditions d'attribution restent à préciser. La société s'est cependant engagée à proposer une réduction de 10% sur le coût de la construction.	A déterminer	A déterminer	
Lot 3	FICHE 3.4	SPRIMONT Création d'un espace de convivialité multiservices	419 265 €	Développement rural Commune	
Lot 3	FICHE 3.5	HORNAY Création d'une Maison de village	A déterminer	A déterminer	03/2016 : réflexion en cours pour le déménagement de la Maison des jeunes et l'agrandissement de l'Ecole du Hornay qui sont des dossiers en lien avec le projet de Maison de village à Hornay. 08/11/2016 : le collège communal attribue le marché de travaux pour la transformation d'un immeuble proche de l'actuelle maison des jeunes, en maison des jeunes. L'actuelle maison des jeunes sera affectées à l'école. Le début des travaux est

					fixé au 27/02/2017.
Lot 3	FICHE 3.8	<p>SPRIMONT (Entité)  Amélioration des conditions locales de déplacements pour les modes doux  <u>Remarque :</u>  Depuis le début du programme de développement rural, plusieurs cheminements piétons ont été réalisés grâce à des programmes de subsidiation divers (plan escargot, PICVerts, crédit d'impulsion, plan trottoirs) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rue Jean Doinet</li> <li>- rue du Doyard</li> <li>- rue d'Andoumont (deux phases)</li> <li>- piétonnier entre le village de Florzé et la place du vieux bac à Sprimont</li> <li>- rue des Fawes et rue de l'Esplanade</li> <li>- rue du Centre</li> </ul> <p>Réalisés courant 2014 des cheminements piétons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rue du Centre et rue J. Schinler</li> <li>- rue du Houmier et rue de l'Eglise</li> </ul>	A déterminer	A déterminer	
Programme d'action	1.8	Prévoir un club pour pensionnés et une piste de pétanque à Dolembreux			
	4.4	Régler le problème de stationnement pour les poids lourds			Solution provisoire avec dispersion des endroits
	Lot 0	Aménagement de la place Neuforge à Sendrogne			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 0	1.1	Prévoir un lieu de rencontre à Adzeux			Levée de boucliers des gens du quartier
Lot 0	2.3	Promouvoir le développement de petits commerces, encourager l'artisanat et limiter l'implantation de grandes surfaces, en tenant compte de la rentabilité.			Difficile de croire au retour des petits commerces de village (question de rentabilité pour eux), même si on peut constater que des petits commerces de ce genre se développent aux pompes à essence
Lot 0	2.7	Organiser des stages et des informations sur les métiers de la pierre			Des cours étaient donnés à l'athénée d'Aywaille. Maintenant c'est au centre de formation du Forem à Grâce-Hollogne. Propositions pour de nouvelles formations en Ourthe Amblève
Lot 0	3.2.	Multiplier les endroits de vente des sacs poubelles, surtout pour les villages isolés			Chaque ménage dispose de containers
Lot 0	3.4	Encourager l'utilisation de l'eau de pluie, la canalisation des ruisseaux			Il n'y a pas besoin de canaliser un ruisseau. C'est anti-écologique

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2.1 :

TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE CONVENTION -EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention-Exécution 2008 Visa 08/48684 du 09/12/2008	PCDR classique	Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village	1.1, 1.2, 1.11, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.3	962.668,00€ arrondi à 1.000.000 €
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>			<b>Date :</b>	
Désignation de l'auteur de projet :			Juillet 2009 Groupe Arcadis	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.			03/10/2011	
Approbation de l'avant-projet par la R.W			23/03/2012	
Approbation du projet pour la phase I (arrière de l'école) par l'A.C.			28/10/2013 et 27/01/2014	
<b>Approbation du projet par le Ministre</b>			Courrier reçu le 10/12/2014	
<b>Adjudication :</b>			27/02/2015	
Décision d'attribution du marché			<b>02/06/2015</b>	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre			<b>17/09/2015</b>	
Début des travaux			<b>19/10/2015</b>	
Réception provisoire			Elle n'a pas encore eu lieu	
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans)

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
Convention-Exécution 2010 Visa 10/36710 du 21/09/10	PCDR classique	WACHIBOUX Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser	3.1, 4.1, 6.2	91.378,04 € (Etat 1) 40.033,53 € (Etat 2) 42.361,42 € (Etat 3) 37.516,12 € (Etat 4 et final) Décompte final = 211.289,11 € TVAC	Collège : 02/04/2014 02/04/2014  30/04/2014  30/07/2014

<b>Etat du patrimoine :</b>				
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>			Oui	Non
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
<b>Le bien est-il loué ?</b>			Oui	Non
<b>Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine <sup>1</sup>	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges			Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices				

<sup>1</sup> Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation.

<b>Fonctionnement du projet et utilisation du bien <sup>2</sup></b>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Passage des crapauds pendant leur migration
Impact des activités sur emploi	néant

---

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2003	2003	27/01/2014, M. le Ministre ayant marqué son accord sur la nouvelle composition le 14/04/2014	
Date des réunions durant l'année écoulée	23/03/2016	Nombre de présents	12
	15/06/2016		11
	26/10/2016		11
	22/12/2016		27 (InterCLDR avec Aywaille)

**Réflexion sur l'opération de développement rural**

Au cours de l'année 2016, les membres se sont tenus informés des dossiers en cours de réalisation suivants et ont réfléchi à la mise en œuvre de différents projets :

**- Fiche 1.1 – Louveigné**

Les membres de la CLDR se sont régulièrement penchés sur l'état d'avancement des travaux de la première phase (plaine multisports avec voirie piétonne, parking de 75 places, dépose minute et jeux pour enfants) et sur les perspectives quant à la deuxième phase de ce projet. Concernant la phase 1 : les travaux du parking (lot1) entrepris en octobre 2015 par *ABTECH*, mais ralentis par les conditions climatiques, ont repris en avril 2016. Ceux de la plaine multisports (lot 2 attribué à l'entreprise *LESUCO*) ont débuté en juin 2016. Quant à la phase 2 du projet visant à favoriser le cheminement sécurisé entre les principales infrastructures, au regard de l'obligation de réaliser ces travaux en concertation avec le MET (gestionnaire de la voiries principale), d'un renfort de sécurité récemment justifié par un accès par l'arrière de l'école et en l'absence de réponse du *SPW-DGO Routes et Bâtiments*, les aménagements prévus au centre de Louveigné, considéré comme étant dans une situation lamentable, et de la rue Pérréon sont en suspens.



- **Fiche 1.4 – Damré**

Après un nouvel estimatif et suite à la reconnaissance du *Chemin De Fer de Sprimont* comme organisme touristique par le CGT, la fiche-projet visant à favoriser le caractère convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du *Chemin de Fer de Sprimont (CFS)* a été actualisée et transmise au Ministre de la Ruralité a fait l'objet d'une nouvelle demande de convention. Des démarches ont été entreprises en fin d'année 2016 et début d'année 2017 afin de définir prochainement quel pouvoir subsidiant (entre la Commune, le CGT et la Direction du Développement Rural) pourrait respectivement prendre en charge les divers aménagements. Dès lors que le Développement rural n'intervient que si d'autres financements ne sont pas possibles, la CLDR souhaite vivement que le CGT (qui ne devrait plus hésiter à subsidier 60% des voies ferrées vu sa récente reconnaissance du *CFS* comme organisme touristique) prenne position quant à cette subvention afin de pouvoir poursuivre le dossier. Toutefois aucune promesse d'octroi du subside par le Ministre n'a encore été faite. Les postes relatifs aux voies ferrées pourraient donc être éligibles en plus du bâtiment d'accueil, du mobilier urbain fixé et de la signalisation (cf. courrier du CGT daté du 20/04/2012). Quant au *Centre d'Interprétation de la Pierre*, si les travaux se terminent, il manque cependant l'important subside relatif à la scénographie que le CGT tarde à octroyer. Il le trouve en effet trop élevé, et ce malgré une proposition d'échelonnement des versements sur plusieurs années. L'administration communale et l'auteur de projet ont donc envisagé en fin d'année une réduction financière du projet.

- **Fiche 3.5 - Maison de village au Hornay (projet en attente)**

Après une réflexion en 2015 sur ce projet en relation avec celui de lotissement au Hornay intégrant une possibilité de construire cette maison sur une des parcelles du futur lotissement, les membres de la CLDR ont été informés d'une réflexion de mise en relation avec d'autres dossiers liés (déménagement de la Maison des Jeunes et agrandissement de l'Ecole du Hornay).

Outre un intérêt pour le **PCDN** et pour la **transcommunalité** (organisation de séances plénières interCLDR), la CLDR avait aussi lancé un Projet de **GAL (Groupe d'Action Locale Ourthe-Vesdre-Ambève)**, qui n'a pas été retenu.

Arrivant bientôt à la fin de validité du PCDR (en septembre 2017), la commune se positionne en faveur du renouvellement du PCDR et souhaite à nouveau collaborer avec le *GREOVA*.

Propositions de projets à entreprendre	
Numéro fiche-projet	1.4
Intitulé du projet	DAMRE - Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le Prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'Interprétation de la Pierre.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS L'ANNEE AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel +1	Lot 1	FICHE 1.4: DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre	Fiche de départ : 242 728 €  Actualisation 2012 : 336.663,14 €	Développement rural	60% pour une partie des postes
				Commune	40%
				CGT	60% pour une partie des postes



# Commission Locale de Développement Rural<sup>3</sup>

## *RAPPORT ANNUEL 2016*

---

<sup>3</sup> Ce rapport est établi conformément au décret du 11 avril 2014

1.

## 2. Etat d'avancement de l'Opération de Développement Rural (ODR)

Décision du Conseil communal de mener une ODR	7 juillet 2000
Premières réunions	Janvier 2004
Approbation du PCDR par le Conseil communal	23 février 2007
Présentation du PCDR en CRAT	10 mai 2007
Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon	13 septembre 2007
Durée de validité du PCDR	10 ans (2017)
Conventions en cours : 2 (bientôt 3)	
- Aménagement du centre de Louveigné	2008
- Aménagement de crapauducs à Wachiboux (finalisé)	2010
- Troisième demande de convention pour l'aménagement des voies du <i>Chemin De Fer</i> à Damré	2013-2016 (a trainé)

## 3. Les réunions de la CLDR en 2016

La CLDR s'est réunie à quatre reprises en 2016. Les PV des réunions sont annexés à ce rapport. Un résumé de ceux-ci est présenté ci-dessous.

### ***CLDR plénière du 23 mars 2016***

La séance a commencé avec l'état d'avancement des travaux à ***Louveigné (fiche 1.1)*** et du ***Centre d'Interprétation de la Pierre à Damré (fiche 1.3)***. La Commune a informé les membres des avancées du dossier de cette dernière ; la fiche-projet actualisée a été approuvée par les membres. Elle a été transmise au Ministre de la ruralité le 18 avril 2016. Lors de cette réunion, les membres ont également été informés de la réflexion en cours pour le déménagement de la *Maison des jeunes* et l'agrandissement de *l'Ecole du Hornay* qui sont des dossiers en lien avec le projet de ***Maison de village à Hornay (fiche 3.5)***.

### ***CLDR plénière du 15 juin 2016***

C'est la ***fiche 1.1 Louveigné*** qui a d'abord été abordée : les travaux du parking sont en cours (par l'entreprise *ABTECH*) mais ralentis par les conditions climatiques tandis que les travaux de la plaine multisports (lot 2 attribué à l'entreprise *LESUCO*) devraient démarrer en août. Suite à du vandalisme à l'arrière de l'école est émis le souhait du Collège communal d'y placer des caméras. C'est ensuite le ***projet Damré (fiche 1.4)*** qui a fait l'objet de la réunion : le nouvel estimatif approuvé par la précédente CLDR (23/03/2016) va être transmis au Ministre Collin (Agriculture, Nature et Ruralité). Est aussi annoncé que le *Chemin De Fer de Sprimont* a été reconnu comme organisme touristique par le CGT. Quant au *Centre d'Interprétation de la Pierre*, il a fait l'objet d'une présentation par sa conservatrice avec support visuel aux membres de la *CLDR* détaillant les travaux en cours et insistant sur l'important subside relatif à la scénographie, toujours en attente de la part du *CGT*.

### ***CLDR plénière du 26 octobre 2016***

Après explication du Bourgmestre sur le changement d'appellation de l'organisme accompagnateur du PCDR (*Greoa* devient *Greova*), les membres font le point sur

l'état d'avancement des travaux à **Louveigné (fiche 1.1)** : les travaux se terminent et il reste l'installation de l'éclairage et des caméras et la pose d'une couche de finition. Ensuite l'attention des membres se porte sur la fiche **Damré (fiche 1.4)**. A cet effet, suite au courrier reçu du Ministre Collin par l'administration communale, une rencontre aura lieu prochainement entre le *CGT*, la Commune et la *Direction du Développement Rural de la DGO3* pour connaître la répartition des postes subsidiables. Enfin, il est annoncé que pour le **PCDN**, il faudra passer par la *FRW*, le *GREOVA* ne pouvant en être l'organisme accompagnateur, et que le projet du **GAL OVA** n'a pas été retenu.

#### **InterCLDR plénière Sprimont – Aywaille du 22 décembre 2016**

Outre née d'une volonté de favoriser et de renforcer les échanges entre citoyens, cette rencontre « test » devait permettre à ces derniers de prendre connaissance des projets en cours de réalisation au sein de l'entité communale voisine et d'échanger expériences et réflexions sur des thèmes liés à la transcommunalité. Après une respective approbation des procès-verbaux précédents, la séance se penche d'abord sur le PCDR de l'entité de Sprimont avec l'évaluation de la **fiche 1.1 Louveigné**. Après un bref récapitulatif du projet relatif à la revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village de Louveigné, visant à soutenir ses activités et favoriser le cheminement sécurisé entre les principales infrastructures, il est rappelé que les travaux doivent être réalisés en concertation avec le MET (gestionnaire de la voirie principale). La première phase relative à l'aménagement d'un parking et d'une plaine multisports sera terminée d'ici quelques semaines. L'attention se tourne ensuite sur le projet abouti et inauguré en septembre 2014 des crapauducs de **Wachiboux (fiche 1.2)**. Ensuite le projet **Damré (fiche 1.4)** est abordé comme visant à favoriser le caractère convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du *Chemin de Fer de Sprimont (CFS)*. Après le rappel du Bourgmestre quant à la fin de validité du PCDR en septembre 2017, le Conseil communal se positionne en faveur du renouvellement du PCDR et désigne à nouveau le *GREOVA* comme organisme accompagnateur. Enfin, après que la séance se soit attardée sur les projets d'Aywaille, s'ensuit une présentation de la *Réforme des Maisons du Tourisme de Wallonie* par le directeur du *GREOVA*.

#### **4. Initiatives de la CLDR**

- Réponse à l'appel à projet **GAL (Groupe d'action locale) Ourthe Vesdre Amblève**

#### **5. Etat d'avancement (ou de finalité) des projets en convention**

##### **Louveigné (fiche 1.1)**

Le dossier projet de la première phase concernant la plaine multisports, en ce compris l'aménagement d'une voirie piétonne, un parking de 75 places, un dépose minute et des jeux pour les enfants, a été approuvé par le Ministre. La mise en adjudication du marché a eu lieu le 16 janvier 2015 et la réception des offres le 27 février 2015 ; le Collège communal s'est prononcé sur l'attribution du marché le 2 juin 2015. Le marché a été attribué à l'association momentanée *ABTECH-IDEMASPORT*. Le dossier d'adjudication a été transmis à l'Administration régionale et à la tutelle en date du 15 juin 2015 pour le lot 1 et le 8 juillet 2015 pour le lot 2. L'accord pour le lot 1 a été reçu le 29 septembre 2015. Les travaux ont débuté le 19 octobre 2015 mais ont été rapidement suspendus en raison des conditions climatiques hivernales. Ils ont

repris le 18 avril 2016. En ce qui concerne le lot 2, les travaux ont démarré le 20 juin 2016. Si les conditions climatiques le permettent, les travaux pourraient être terminés à la fin de l'année 2016. La première phase relative à l'aménagement d'un parking et d'une plaine multisports est terminée. La seconde phase du projet concernant les travaux à réaliser en collaboration avec le *SPW – DGO Routes et Bâtiments* n'est pas encore à l'ordre du jour.

#### ***Damré (fiche 1.4)***

Concernant la demande de convention introduite par la Commune auprès de la Région (Damré), une réunion s'est déroulée à Namur le 22 octobre 2013 suite au dossier envoyé au *CGT* en mars 2013. Des démarches ont été entreprises afin de définir quel pouvoir subsidiant prendrait en charge l'aménagement des voies de chemin de fer. La Commune a transmis la fiche actualisée au Ministre de la Ruralité le 18 avril 2016. Une réunion a été organisée le 31 janvier 2017 entre la Commune, le *CGT* et la *Direction du Développement Rural* afin de faire le point sur la fiche-projet. Dès lors que le *Développement rural* n'intervient que si d'autres financements ne sont pas possibles, il est vivement souhaité que le *CGT* prenne position quant à la subvention des voies ferrées afin de pouvoir poursuivre ce dossier. Au vu l'évolution du *CFS*, le *CGT* ne devrait plus hésiter quant à la prise en charges des voies ferrées (60% de subsides), sans toutefois promettre l'octroi du subside par le Ministre. Les postes relatifs aux voies ferrées pourraient donc être éligibles en plus du bâtiment d'accueil, du mobilier urbain fixé et de la signalisation. Il est par conséquent convenu que l'administration communale établisse une nouvelle note précisant la répartition des postes subsidiables par le *CGT* et par le Développement rural. Cette note sera ensuite transmise au *CGT* et au Développement rural pour accord.

## **6. Perspectives pour 2017**

Poursuite des projets en cours :

- Entrée en convention du **projet 1.4 Damré** après une répartition des postes subsidiables par le *CGT* (*qui devrait prendre en charge les coûts d'allongement du CFS*), le *Développement Durable* et la Commune.

**Commune de Sprimont**  
Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)

**Procès verbal de la réunion du 23 mars 2016**

Sont présents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, BOZET Jean-Luc, COGNIAUX Franz, DELMAL Christiane, DELHAXHE Eric, DELVAUX Luc, DYKMANS Pierre, LEVERD Dominique, MARCHAL Odette, SCHYNS Frédéric et t'SERSTEVENS Jean-Marc.

Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR.

Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission.

Madame LEUSCH Amandine, Agent de développement local GREOA.

Sont excusés :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission DEFAYS Alain, DEFLANDRE Yves, PICQUOT Isabelle, MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, ROUXHET Olivier et THIL Eric.

Monsieur LILIE Jacques, Directeur du GREOA.

Sont absents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, DEFGNEE Henry-Jean, DELPORTE Pierino, GEORGES Muriel, GRUSELIN Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, PONTHER Joseph et VOUE Lucie.

**1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16/12/2015**

Le procès-verbal de la séance du 16/12/2015 est approuvé.

**2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2015**

Le rapport annuel 2015 était joint à la convocation. Les membres présents ayant pu en prendre préalablement connaissance, décident d'approuver le rapport annuel 2015.

**La réflexion sur l'opération de développement rural :**

Au cours de l'année 2015, les membres se sont tenus informés des dossiers en cours de réalisation et ont réfléchi à la mise en œuvre de différents projets :

- Fiche 1.4 « Damré » : la CLDR et la Commune sont en attente d'une décision du DR et du CGT.

- Fiche 2.2. « Adzeu-habitat permanent » : les membres de la CLDR avaient pris la décision de prioriser cette fiche-projet en regard de la situation des personnes y résidant de manière permanente. Au cours des 4 réunions, ils ont poursuivi leurs réflexions concernant l'état d'avancement du projet et les aménagements à réaliser (voirie, alimentation en eau et électricité, etc.).

- Fiche 3.5 Maison de village au Hornay : la CLDR a réfléchi à l'opportunité de mettre en œuvre la fiche-projet, notamment en relation avec le projet de lotissement au Hornay. Il existe en effet une possibilité de construire cette maison sur une des parcelles du futur lotissement.

- Fiche 2.5 (Banneux-apparitions) aménagements afin de favoriser le tourisme, la convivialité et la sécurité aux abords du centre marial : suite à une présentation, par les agents de développement, du Programme wallon de Développement Rural 2014-2020, la CLDR a marqué son soutien pour l'introduction d'un dossier de candidature - en réponse à la mesure 7.5. (Infrastructures touristiques) – concernant l'aménagement des abords de l'Office du Tourisme et de manière plus large la place de Banneux en tant que lieu d'accueil touristique et de départ de promenades.

- développement d'actions pour une commune sans pesticides.

Enfin, le PCDR étant approuvé jusqu'en septembre 2017, l'idée de redémarrer une nouvelle ODR sur l'entité a été évoquée et soutenue par la CLDR.

### 3. SITUATION DES FICHES EN COURS

#### Fiche 1.4 « Damré »

L'administration communale a réévalué les chiffres (la partie amélioration de la voirie et des canalisations devant être à charge de la commune) :

N°	Désignation	Unité	Qt présumées	Pu	Total
1	Sciage revêtement	mct	270	3,00	810
2	Démolition revêtement	M²	250	10,00	2500
3	Démolition de fondation en voirie prof 60 cm	M³	200	20	4000
4	Démolition d'élément linéaire (bordure de 10 cm)	mct	250	9,0	2250
5	Pose bordure 100/30/10 sur béton maigre 15 cm	mct	250	28,00	7000
6	Sous fondation type II épaisseur 30 cm	M²	480	15,6	7488
7	Fondation béton maigre épaisseur 20 cm	M²	480	20,00	9600
8	Fourniture et pose de la voie, plus aiguillages	mct	312	285,00	88920
9	Ragréage entre les voies au béton riche 350 kg/m³ treillis 150/150/8	M²	190	55,00	10450
10	Réparation bande de tarmac contre la voie y compris joint toc et couche d'accrochage.	M²	250	35,60	8900
11	Réalisation d'un petit bâtiment d'accueil y compris sanitaire standard et pour pmr, raccordement à l'égout, et aux impétrants. Dimension approximative 20 m²	Forfait	1	26000	26000
12	Evacuation déblais en cet ou cta	Tonne	310	10	3100
13	Mobilier urbain (poubelles etc )	Forfait	1	1000	1000
14	Signalisations diverses, panneaux didactiques etc ...	Forfait	1	4650	4650
15	Modification réseau électrique et éclairage du parcours	Forfait	1	9860	9860
16	Somme réservée pour travaux supplémentaires (mauvaise poche, déplacement impétrants swde... et aménagement pour raccordement avec entrées riverains rencontrées.)	SAJ	1	10000	10000
17	Bureau d'étude, projet et surveillance	SAJ	1	15000	15000
	<b>TOTAL</b>		<b>211.528 €</b>		
	<b>TVA 21%</b>		<b>44420,88 €</b>		
	<b>TOTAL TVA COMPRISE</b>		<b>255948,88 €</b>		

La CLDR approuve ce nouvel estimatif qui sera transmis à M. le Ministre COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité.

M. Dyckmans informe les membres que le Chemin de Fer de Sprimont est reconnu comme organisme touristique depuis peu.



#### **4. DIVERS**

##### **Centre d'Interprétation de la Pierre**

Les travaux de gros œuvre avancent bien.

L'administration communale n'a toujours pas reçu l'approbation du subside pour la partie scénographie.

Il est proposé aux membres de visionner le projet de scénographie élaboré par M. Steenhaut, auteur de projet désigné, lors d'une prochaine séance.

##### **Maison de village – Hornay**

Le projet de la Maison des Jeunes dans l'ancienne « maison Pondant » avance.

Le marché de travaux devra prochainement être présenté au conseil communal pour approbation.

Le montant estimé des travaux est élevé, +/- 800.000 €

Il faut cependant bien retenir que ce projet bénéficiera à plusieurs intervenants :

- l'école qui pourra ainsi s'agrandir en utilisant les anciens locaux de la Maison des Jeunes ;
- les citoyens, autres que les jeunes, via des projets de cohésion sociale.

Les jeunes, l'école et le quartier pourront donc tous être gagnants.

##### **Adzeux**

Concernant l'intégration de la voirie actuelle dans le domaine public, il reste une dizaine de personnes qui doivent encore marquer leur accord.

## **Commune de Sprimont**

Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)

Procès verbal de la réunion du 16 juin 2016

Sont présents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission COGNIAUX Franz, DELHAXHE Eric, DELVAUX Luc, DYKMANS Pierre, PONTHER Joseph, SCHYNS Frédéric et t'SERSTEVENS Jean-Marc.

Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR.

Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission.

Madame Anouck BARTHELEMY, Agent de développement local GREOA.

Madame Florence DUFRASNE, Conservatrice du Musée de la Pierre, invitée.

Sont excusés :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission DEFLANDRE Yves, DELMAL Christiane, DELPORTE Pierino, GRUSELIN Antoine, LEVERD Dominique et MARCHAL Odette.

Monsieur LILIE Jacques, Directeur du GREOA.

Sont absents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, BOZET Jean-Luc, DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, DEFAYS Alain, DEFGNEE Henry-Jean, GEORGES Muriel, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, PICQUOT Isabelle, MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, ROUXHET Olivier, THIL Eric et VOUE Lucie.

### **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23/03/2016**

Le procès-verbal de la séance du 23/03/2016 est approuvé.

### **SITUATION DES FICHES EN COURS**

#### **Fiche 1.1. « Louveigné »**

Les travaux du parking (lot 1 attribué à l'entreprise ABTECH) avancent doucement en raison des conditions climatiques.

Les travaux de la plaine multisports (lot 2 attribué à l'entreprise LESUCO) devraient démarrer fin juin, mais en raison des congés du bâtiment, ils commenceront plus que probablement début août.

Vu les problèmes de vandalisme déjà connus à l'arrière de l'école, le Collège communal souhaite que soit prévu dans le cadre de ces travaux le placement de plusieurs caméras.

Concernant les aménagements du centre de Louveigné et de la rue du Pérréon, il n'y a aucune nouvelle de la part du SPW-routes. Il faut reconnaître que, du point de vue de la sécurité de l'accès à l'école, ces aménagements deviennent moins urgents, vu que l'accès à l'école se fera bientôt par l'arrière (rue du Doyard). Toutefois la situation du centre de Louveigné reste lamentable.

#### **Fiche 1.4 « Damré »**

Le nouvel estimatif approuvé par la CLDR, en séance du 23/03/2016, va être transmis à M. le Ministre COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité.

M. Dyckmans informe les membres que le Chemin de Fer de Sprimont est reconnu comme organisme touristique depuis peu.

### **DIVERS (PROJECTION DU PROJET SCENOGRAPHIE POUR LE CIP)**

#### **Fiche PWDR introduite par l'Office du Tourisme de Banneux**

La réponse n'est pas encore parvenue.

## GAL

Il n'y a pas encore de nouvelle non plus.

### Centre d'Interpération de la Pierre (CIP)

Madame Dufrasne, conservatrice de l'actuel musée de la Pierre présente, avec support visuel, le projet dont les travaux sont en cours, mais pour lequel un important subside relatif à la scénographie est toujours en attente de la part du CGT.

En bref :

La thématique centrale est l'histoire de la pierre et sa réalisation au sein de Sprimont et en région Ourthe Amblève tout en mettant en évidence les collections existantes.

Ce Centre d'Interpération de la Pierre, d'une superficie de +/- 800 m<sup>2</sup>, s'adressera à tout public.

Le visiteur pourra réaliser le parcours de manière autonome ou avec un guide et sera accessible aux personnes à mobilité réduite.


Le parcours aura plusieurs niveaux de lectures : pour un « public de base », un public averti et également en fonction de la taille du visiteur (enfant, adulte, PMR).

Le visiteur, acteur de sa visite, sera amené à réfléchir, à se poser des questions et pourra effectuer des manipulations.


Le graphisme sera cohérent tout au long du parcours et se devra d'être durable afin de ne pas être démodé trop vite.

D'un point de vue pédagogique la présentation du contenu sera progressive, comme si on entrait dans une histoire.

#### Affectation des espaces

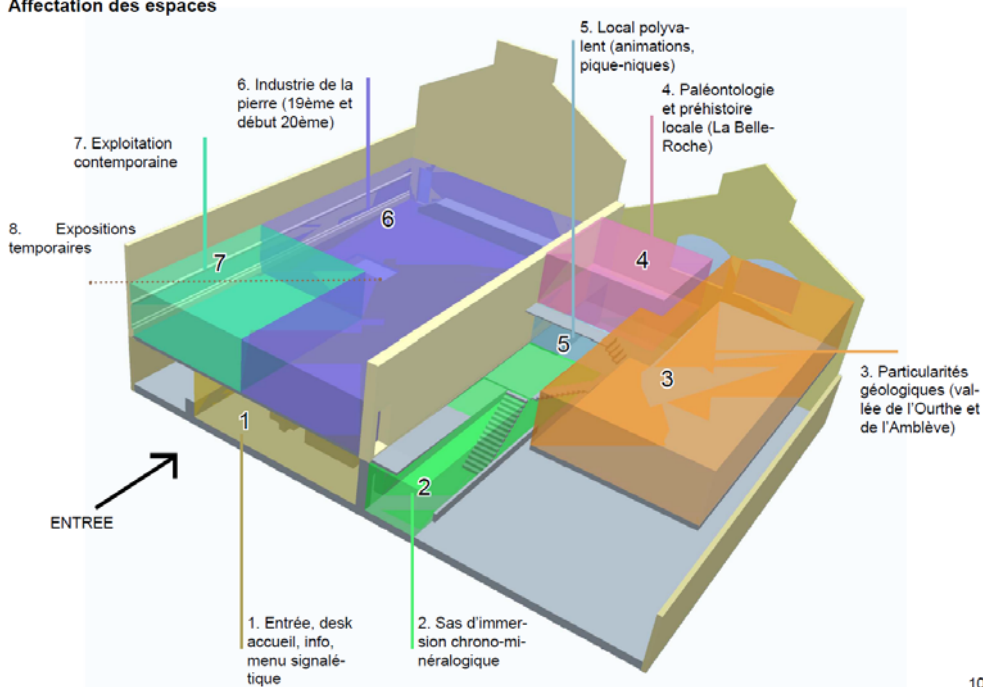

Auteurs de projet:  
Daniel Steenhaut ; scénographe  
Hilke Vervaeke ; designer

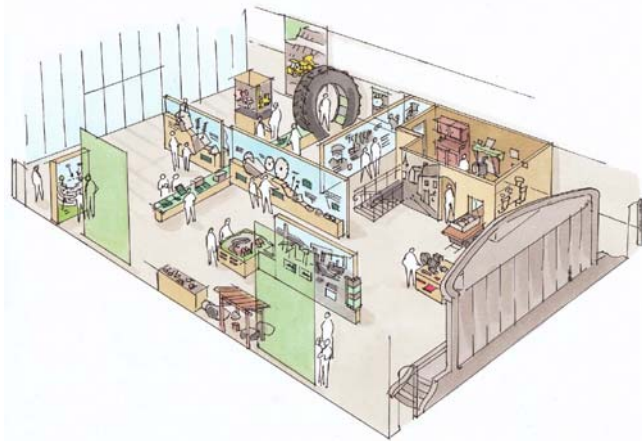

Avec cet outil de qualité, on pérennise la culture et le tourisme au sein de la commune de Sprimont.

Commune de Sprimont  
Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)  
Procès verbal de la réunion du 26 octobre 2016

Sont présents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BOZET Jean-Luc, COGNIAUX Franz, DEFLANDRE Yves, DELMAL Christiane, DYKMANS Pierre, LEVERD Dominique, MARCHAL Odette et t'SERSTEVENS Jean-Marc.

Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR.

Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission.

Madame VANNI Maurine, Agent de développement local GREOA.

Sont excusés :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission DELVAUX Luc.

Monsieur LILLEN Jacques, Directeur du GREOA.

Sont absents :

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, DEFAYS Alain, DEFGENE Henry-Jean, DELHAXHE Eric, DELPORTE Pierino, GEORGES Muriel, GRUSELIN Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, PICQUOT Isabelle, MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, PONTHER Joseph, ROUXHET Olivier, SCHYNS Frédéric, THIL Eric et VOUE Lucie.

Monsieur Ancion explique le GREOA, organisme qui accompagne la CLDR de Sprimont, est devenu le GREOVA, en vue d'honorer les communes de Chaudfontaine et de Trooz (V pour Vesdre – Outhe Amblève Vesdre) qui ont rejoint la Maison du Tourisme.

Le GREOVA s'étend aujourd'hui à treize communes de la province de Liège : Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz.

#### **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16/06/2016**

Le procès-verbal de la séance du 16/06/2016 est approuvé.

#### **SITUATION DES FICHES EN COURS**

##### **Fiche 1.1. « Louveigné »**

Les travaux se terminent. Il reste l'installation de l'éclairage et des caméras, ainsi que la pose d'une couche de finition. Les membres sont invités à aller voir les nouvelles installations sur place.

##### **Fiche 1.4 « Damré »**

L'administration communale a reçu un courrier du cabinet ministériel de M. COLLIN l'informant que la Direction du Développement Rural de la DGO3 était chargée d'organiser une réunion.

#### **DIVERS**

##### **PCDN**

Il faudra passer par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), le GREOVA ne pouvant être organisme accompagnateur.

##### **GAL**

Le projet n'a pas été retenu.

##### **Centre d'Interprétation de la Pierre (CIP)**

Les travaux vont bientôt se terminer. Au niveau de la scénographie, le CGT n'a toujours pas octroyé le subside (car trop élevé), même si la proposition a été faite par l'administration communale d'échelonner les versements sur plusieurs années.

Une réunion est prévue début novembre entre l'administration communale et l'auteur de projet pour envisager une réduction financière éventuelle du projet.

**Prochaine réunion**

La prochaine réunion de la CLDR se tiendra le 22 décembre 2016.

**GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE  
OURTHE-VESDRE-AMBLEVE**

(asbl GREOVA)

---

**INTERCLDR AYWAILLE/SPRIMONT**  
**PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL**  
**Procès-verbal de la réunion du 22 décembre 2016 à 20h00**  
**(Administration communale de Sprimont – rue du Centre 1 à 4140 Sprimont)**

---

**Présents :**

- CLDR Aywaille  
M. M. BARTHOLOME, membre de la CLDR ;  
Mme V. BARTHOLOME, secrétaire de la CLDR ;  
M. D. COUVREUR, membre de la CLDR ;  
M. J-M DECLERCQ, membre de la CLDR ;  
M. Ph. DODRIMONT, Député Bourgmestre d'Aywaille ;  
M. A. HOCQUET, membre de la CLDR ;  
M. R. PARMENTIER, membre de la CLDR ;  
M. F.TIRIONS, membre de la CLDR.

- CLDR Sprimont  
M. C. ANCION, Bourgmestre de Sprimont, Président du GREOVA ;  
M. J-L. BOZET, membre de la CLDR ;  
M. F. COGNIAUX, membre de la CLDR ;  
M. A. DEFAYS, membre de la CLDR ;  
M. E. DELHAXHE, membre de la CLDR ;

Mme Ch. DELMAL, membre de la CLDR ;  
M. L. DELVAUX, échevin à Sprimont ;  
Mme A-F. DELVILLE, secrétaire de la Commission ;  
M. P. DYKMANS, membre de la CLDR ;  
Mme O. MARCHAL, membre de la CLDR ;  
Mme I. PICQUOT, membre de la CLDR ;  
M. F. SCHYNS, membre de la CLDR ;  
M. J-M. T'SERSTEVENS, membre de la CLDR.

- Invités

M. F. FROIDBISE, échevin à Ouffet ;  
Mme R. LARDOT, échevine à Ouffet ;  
Mme M. RAHIER, employée communale à Ferrières.

- GREOVA

M. Ph. GIELSON, graphiste au GREOVA ;  
M. J. LILIEEN, Directeur du GREOVA ;  
Mme M. VANNI, agent de développement au GREOVA.

**Excusés :**

- CLDR Sprimont  
M. E. BIATOUR, membre de la CLDR ;  
M. Y. DEFLANDRE, membre de la CLDR ;  
Mme D. LEVERD, membre de la CLDR.

- Invités

M. D. DE TEMMERMAN, échevin à Trooz ;  
Mme L. IKER, Bourgmestre d'Esneux ;  
M. P.LECERF, Député Bourgmestre de Hamoir ;  
M. M.LEGROS, Bourgmestre en fonction à Hamoir ;  
M. F. LEONARD, Bourgmestre de Ferrières.

La réunion commence à 20h00. M. Ancion remercie les différents membres présents. Il explique à ces derniers que cette réunion « test » vise à rassembler les membres de différentes CLDR accompagnées par le GREOVA et plus particulièrement celles d'Aywaille et de Sprimont et ce, en vue de favoriser les échanges entre citoyens. En outre, cette rencontre InterCLDR permet aux membres de prendre connaissance des projets qui se réalisent dans les communes voisines et, le cas échéant, de participer à des échanges d'expériences et de nourrir une réflexion sur des sujets liés à la transcommunalité.

### **1. Approbation des PV des CLDR d'Aywaille (21.11.16) et de Sprimont (26.10.16)**

Les PV sont approuvés sans remarques.

### **2. Etat d'avancement des dossiers en cours**

#### **2.1 Sprimont**

##### *Fiche 1.1 « Louveigné »*

M. Ancion procède à un bref récapitulatif de la fiche 1.1 relative à la revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village de Louveigné. Ce projet vise à soutenir les activités du village et favoriser le cheminement sécurisé entre les principales infrastructures. M. Ancion rappelle que les travaux doivent être réalisés en concertation avec le MET (gestionnaire de la voirie principale). La première phase relative à l'aménagement d'un parking et d'une plaine multisports sera terminée d'ici quelques semaines.

##### *Fiche 1.2 « Wachiboux »*

M. Ancion rappelle brièvement qu'une première convention a été demandée au développement rural et a abouti à l'aménagement de crapauducs à Wichiboux. L'inauguration a eu lieu le 05 septembre 2014.

##### *Fiche 1.4 « Damré »*

M. Ancion précise que cette fiche vise à favoriser le caractère convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS). Il explique que l'activation de cette fiche-projet est en cours de réflexion depuis plusieurs années puisqu'une partie des aménagements souhaités sont du ressort du CGT. Une rencontre entre l'Administration communale, le CGT et la Direction du Développement rural aura lieu prochainement pour se positionner quant à l'activation de cette fiche.

##### *Renouvellement du PCDR*

M. Ancion rappelle aux membres que le PCDR arrivera en fin de validité en septembre 2017. Le Conseil communal s'est positionné en faveur du renouvellement du PCDR et s'est accordé sur la désignation du GREOVA comme organisme accompagnateur.



## 2.2 Aywaille

### *Maison de village à Nonceveux*

Il est rappelé aux membres que la commune a effectué une demande de convention au développement rural pour créer une Maison de village à Nonceveux. Ces travaux, en cours actuellement, accusent un retard par rapport au délai initialement imparti pour leur réalisation en raison de nombreux temps d'arrêt de l'entrepreneur qui connaît des difficultés financières.

### *Centre d'Aywaille*

M. Dodrimont rappelle que l'aménagement du Centre d'Aywaille nécessite de réaliser des travaux d'égouttage afin de relier les ménages au collecteur existant. C'est un projet qui inclut la coordination de bon nombre d'acteurs tels que la SPGE, l'AIDE, la SWDE et autres impétrants. La commune souhaite profiter de l'opportunité pour réaménager le centre afin, d'une part, de diminuer la place accordée à la voiture et, d'autre part, d'augmenter l'attractivité de ce dernier en créant davantage de zones de convivialité et d'espaces à disposition des piétons. M. Dodrimont précise qu'une demande de convention au développement rural permettrait d'aménager la place et ses abords pour dynamiser le commerce et la convivialité dans le centre.

M. Dodrimont explique qu'une enveloppe budgétaire a été octroyée par la Région wallonne pour l'aménagement de la national 633 (placement de ronds-points au niveau du Delhaize et au pied de la bretelle d'autoroute + sécurisation). Il précise ensuite qu'une partie de cette enveloppe budgétaire pourra être investie dans l'aménagement du centre d'Aywaille. Le bureau Lacasse a été désigné comme auteur de projet pour l'aménagement de la national 633.

## **3. Présentation de la réforme des Maisons du Tourisme**

M. Lilien poursuit la réunion par une présentation de la réforme des Maisons du Tourisme actuellement en cours au niveau wallon (cf. Power-point en annexe).

## **4. Divers**

M. Dodrimont informe les membres de la création d'un espace dédié au cyclisme qui sera situé dans l'immeuble (actuellement en cours de rénovation) destiné à accueillir les services de la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève (inauguration programmée en avril 2018). Il précise en outre que le dossier d'aménagement du parc communal d'Aywaille introduit dans le cadre de l'appel à projets PwDR 2014-2020 relatif à l'investissement dans de petites infrastructures touristiques (mesure 7.5) n'a pas été retenu par le Gouvernement wallon.

### Bilan de la rencontre

Cette première réunion InterCLDR a débouché sur une évaluation positive de la part des participants. Elle leur a donné l'opportunité de consolider les liens existants et d'en créer de nouveaux, d'échanger et de partager leurs expériences en toute convivialité. Ce type de rencontre InterCLDR constituera à l'avenir une méthode de travail à privilégier pour mener une réflexion sur la réalisation de projets à dimension transcommunale.

La séance se clôture à 21h00 par un verre d'amitié accompagné d'une dégustation de produits de terroir.
